

入札説明書に対する質疑事項の回答

工事名： 滋賀医科大学附属病院C病棟4階無菌室(C409等)改修機械設備工事


課長	課長補佐	係長	主任	
				

質 疑 回 答 書

工事名： 滋賀医科大学附属病院C病棟 4 階無菌室（C4 O 9 等）改修機械設備工事

質疑		図面番号	回答	
1	衛生設備 4 階平面図（改修）図面左下記載のPS上水立管75Aより分岐延長（不断水バルブ75x50）とありますが、不断水バルブメーカーに確認したところ立管からの不断水バルブ取付はNGとの回答なので断水切り分岐工事で見込んで宜しいでしょうか。	M-14	1	サポートを設置し、不断水バルブで計画すること。
2	同上記載50Aパルス発信機付量水器は更新と解釈して宜しいでしょうか。また注記 4 にて既設中水配管は立管切り離し、配管洗浄後上水系統の配管として再利用するとありますが通水フラッシングのみと解釈してよろしいでしょうか。	M-14	2	よろしい。
3	M-13、衛生設備器具リスト（改修）にて洗面器用化粧鏡品番YM4560F(TOTO)とありますが、M-15、衛生設備無菌室ユニット平面図（改修）展開図では化粧鏡、木製枠（新設）x6とあります。器具リストを正と考えて宜しいでしょうか。	M-13・15	3	よろしい。
4	消火設備 4 階平面図（改修）図面におきまして、スプリンクラー配管口径65Aよりヘッド数24個が割当てされていますが、65Aでは最大数20個迄になりますので口径80A部より50A配管を別分岐して不足ヘッド数と予備に充当する計画見込みで宜しいでしょうか。	M-17	4	よろしい。 M-17図を別紙の通り差し替える。
5	医療ガス設備 4 階平面図（改修）・（撤去）図におきまして既設医療ガスメイン配管が廊下に記載ありますが既設病室内（C411～C414）にあった場合、新設空調機器等との干渉を考慮してメイン配管引き直しを見込んだほうが宜しいでしょうか。	M-19・29	5	設計図の通りとする。

質疑		図面番号	回答	
6	医療ガス設備 4 階平面図（改修）・（撤去）に記載あります改修要領医療ガス停止：1 日に伴う医療ガス供給停止対応（バックアップ）は見込まなくて宜しいでしょうか。	M-19・29	6	よろしい。
7	3 階内部仮設計画平面図の天井内改修エリアにおける壁・床・天井部全ての初回養生は別途建築工事と考えて宜しいでしょうか。	現場説明書別図 1	7	よろしい。
8	図面記載工事用地に仮設事務所及び休憩所の設置は可能でしょうか。	現場説明書別図 1	8	現場事務所が必要な場合は監督職員と協議の上決定すること。

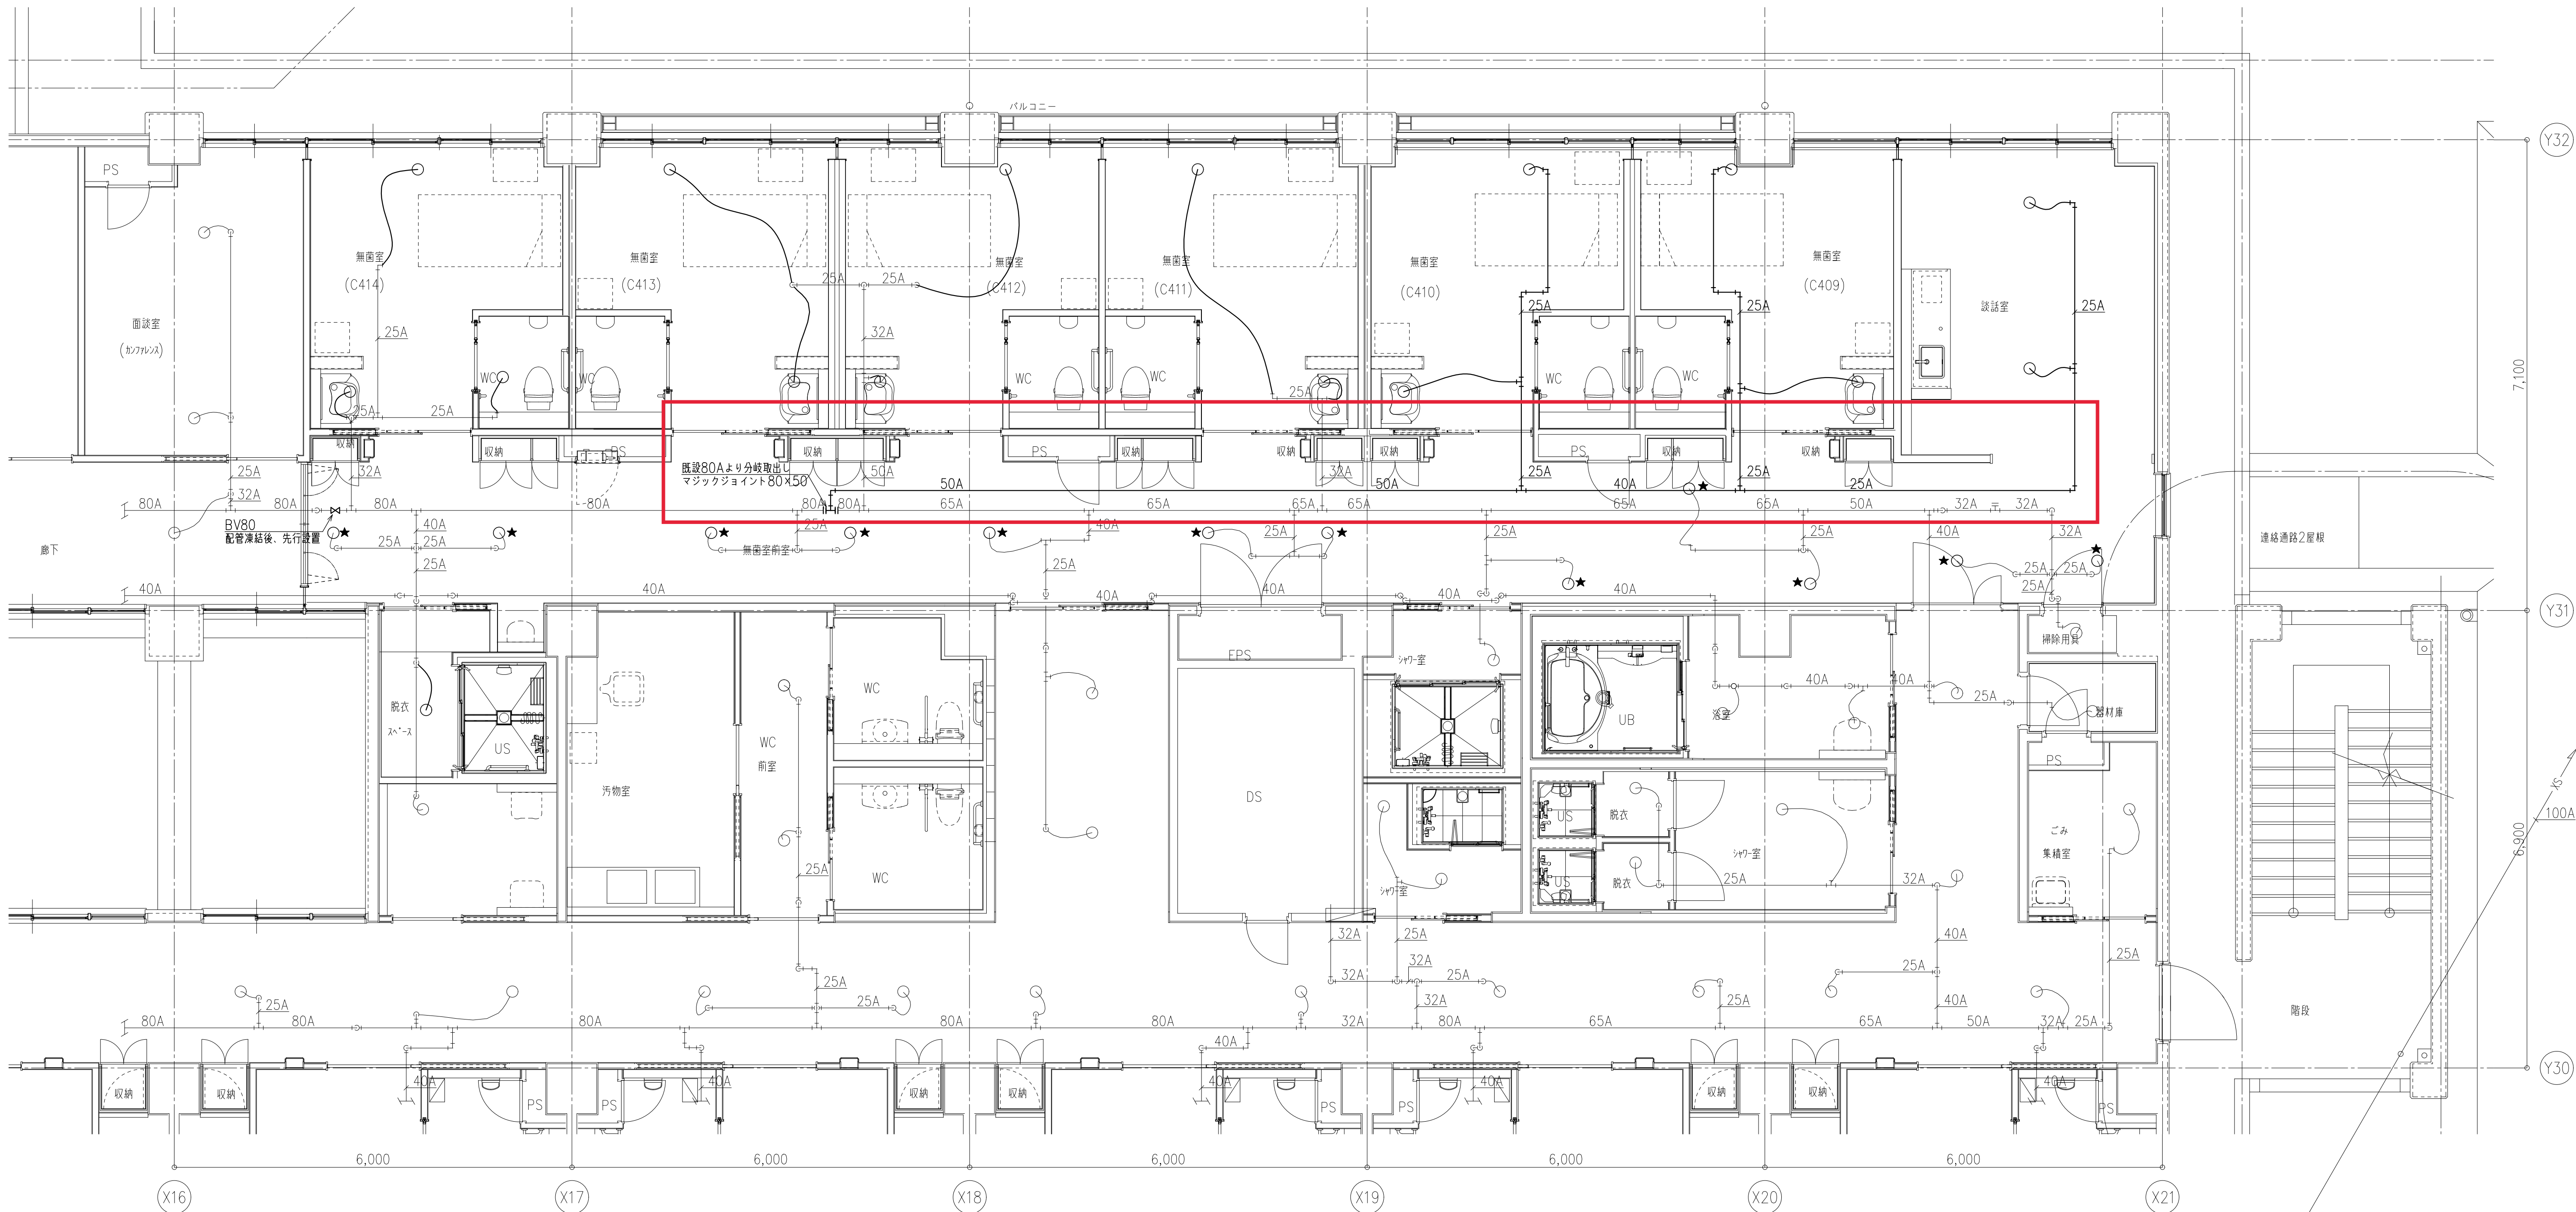

変更箇所を示す。

消火設備 C病棟4階平面図(改修) S=1/50

- 注 記
1. 図中太線部分の器具・配管等は改修を示す。
 2. 図中 ―H― 部は配管の接続位置を示す。
 3. 図中 ★ は天井撤去・改修に伴うスプリンクラーヘッドの脱着を示す。
 4. 天井撤去・改修は別途建築工事とする。
 5. 凍結工法により配管凍結後、配管の撤去・切替を行うこと。
 6. 工事範囲外の消火設備は機能維持すること。

凡 例		
記 号	名 称	備 考
—	スプリンクラー配管	配管用炭素鋼管 (SGP)
○	スプリンクラーヘッド	高感度型 72℃

既設スプリンクラーヘッドは全て着出しフレキ管付である。

株式会社 新日本設備計画

1級建築士登録第322178号

今井 宏二

加地

桃木

藤本

設計業務名

滋賀医科大学附属病院 4 C 病棟無菌室設備設計業務

図番 M-17	工事名称	滋賀医科大学附属病院C病棟4階無菌室 (C409等) 改修機械設備工事		
	図面名称	消火設備 4 階平面図 (改修)		
	年月日	令和 7 年 6 月	縮尺	A1 : 1/50 A3 : 1/100 図面N. 17 / 29
	国立大学法人 滋賀医科大学	施設課長 佐藤 隆	課長補佐 佐藤 隆	係長 佐藤 隆
